

# Informationsvorlage

Fachbereich:	FB Z3 Finanzen	Datum:	06.11.2018
Berichtersteller:	Alt, Jürgen	AZ:	FB 43
		Vorlage Nr.:	151/2018

<b>Beratungsfolge</b>	<b>Termin</b>	<b>Behandlung</b>
Bauausschuss	13.11.2018	öffentlich -


## Tiefbaumaßnahmen des Landkreises Coburg; Sachstandsbericht zu den laufenden Baumaßnahmen

### I. Sachverhalt

#### 1. Kreisstraßen, Deckenbau allgemein HHSt 1.6500.9501

##### **Kreisstraße CO 4 – Deckenbau in der OD Grattstadt**

VZ 2015: 930 Kfz/24h, 34 SV (=3,7%)

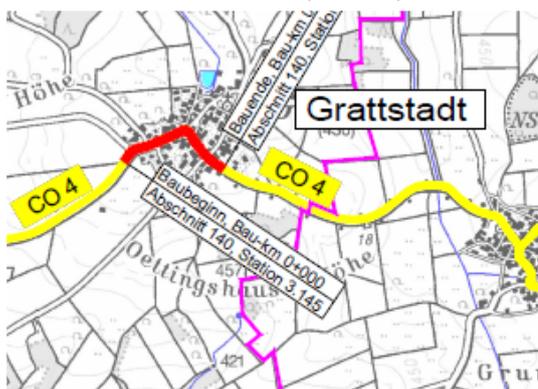

Die Baumaßnahme durch die Firma Stolz ist abgeschlossen, die Abnahme erfolgt am 12.11.2018. Die Schlussrechnung liegt noch nicht vor. Die Auftragssumme in Höhe von rund 195.000 € wird geringfügig überschritten werden.

##### **Kreisstraße CO 12 – Deckenbau in der OD Großheirath**


VZ 2015: 1.038 Kfz/24h, 41 SV (=3,9%)



Die Baumaßnahme wird durch die Firma Richard Schulz im Frühjahr 2019 begonnen. Die Auftragssumme beträgt rund 210.000 €.

### Kreisstraße CO 16 – Deckenbau zwischen Lechenroth und Oberelldorf

VZ 2015: 168 Kfz/24h, 7 SV (=4,2%)

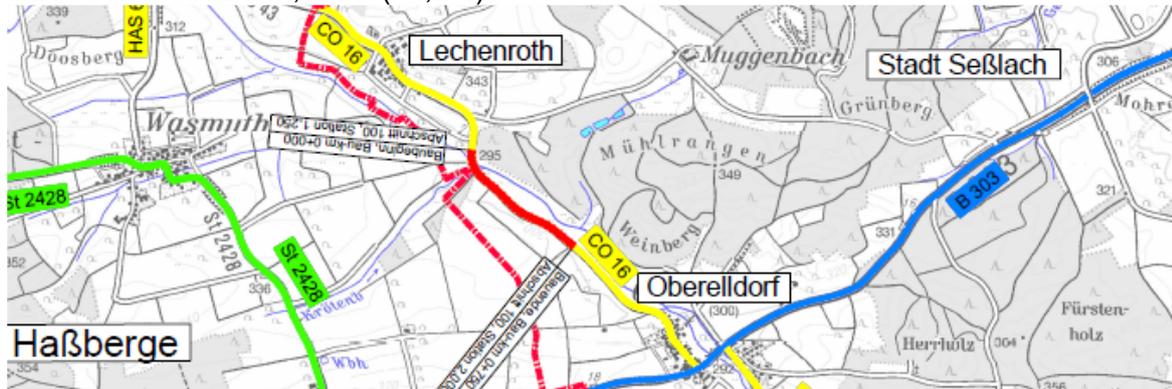

Die Baumaßnahme durch die Firma Rädlinger ist abgeschlossen, die Abnahme erfolgte am 27.09.2018. Die Schlussrechnung liegt noch nicht vor. Die Auftragssumme in Höhe von rund 260.000 € wird bedingt durch zusätzlich erforderliche Leistungen im Zuge der Bauausführung etwas überschritten werden.

### 2. Kreisstraße CO 4, Ersatzneubau der Brücke über die Nerde in Meeder HHSt 1.6504.9501



VZ 2015: 2.816 Kfz/24h, 257 SV (=9,1%)

Hierzu wird im Rahmen der sonstigen amtlichen Mitteilung in nichtöffentlicher Sitzung berichtet.

### 3. Kreisstraße CO 4, Ausbau der OD Bad Rodach, Richtung Heldritt HHSt 1.6504.9502



VZ 2015: 2.397 Kfz/24h, 39 SV (=1,6%)

Die baufachliche Stellungnahme liegt noch nicht vor. Nach Eingang und Einarbeitung darin

evtl. geforderter Auflagen werden die Zuwendungsunterlagen bei der Regierung in Bayreuth eingereicht.


**4. Kreisstraße CO 4, Ausbau der OD Weidach  
HHSt 1.6504.9506**



VZ 2015: 1.419 Kfz/24h, 98 SV (=6,9%)

Die Baumaßnahme durch die Firma Strabag ist abgeschlossen. Die Schlussrechnung liegt noch nicht vor.

**5. Kreisstraße CO 4, Ausbau von Weidach bis zur Stadtgrenze  
HHSt 1.6504.9507**

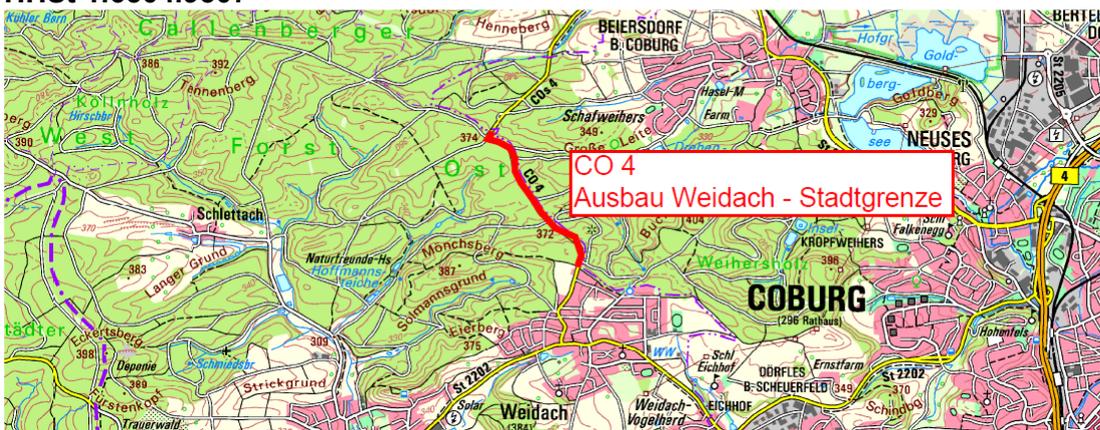

VZ 2015: 1.419 Kfz/24h, 98 SV (=6,9%)

Hierzu wird im Rahmen des TOP 7 in öffentlicher Sitzung berichtet.


**6. Kreisstraße CO 4, Erneuerung Grundgrabenbrücke bei Ottowind  
HHSt 1.6504.9508**



VZ 2015: 920 Kfz/24h, 31 SV (=3,4%)

Hierzu wird im Rahmen der sonstigen amtlichen Mitteilung in nichtöffentlicher Sitzung berichtet.


**7. Kreisstraße CO 4, Ersatzbepflanzung der Allee Meeder - Grattstadt  
HHSt 1.6504.9509**

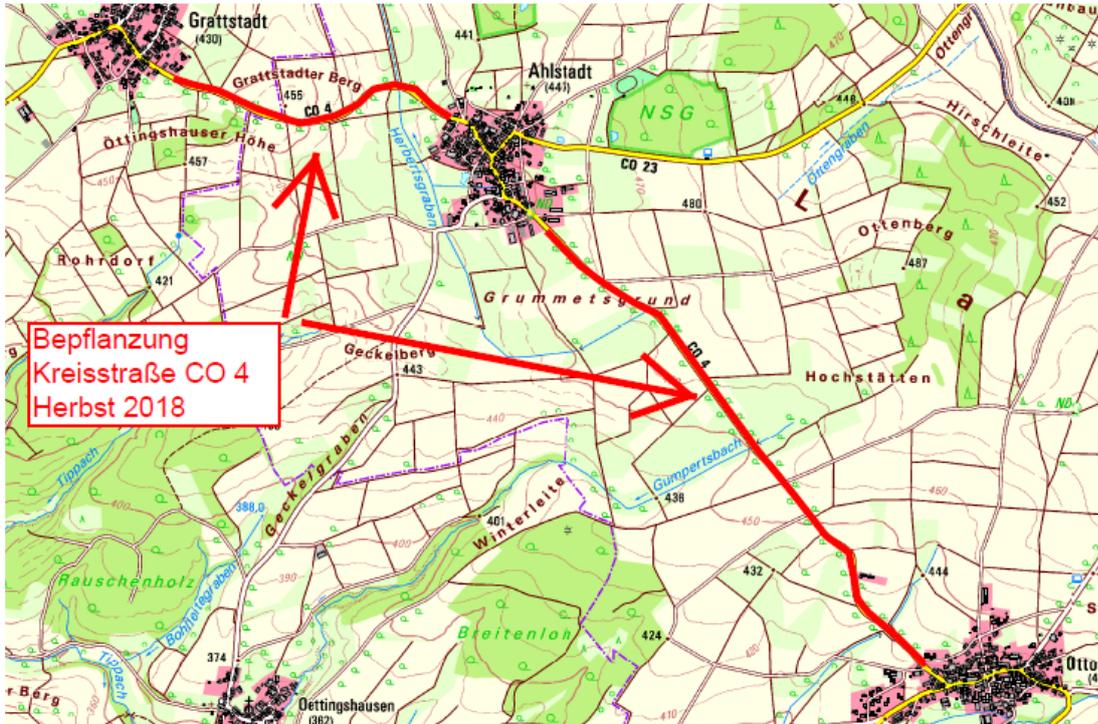

VZ 2015: 930 Kfz/24h, 34 SV (=3,7%), bzw. 410 Kfz/24h, 18 SV (=4,6%)

Die mit der Unteren Naturschutzbehörde abgestimmten Arbeiten werden im November von der Firma Regenfuß, Marloffstein begonnen und noch im Jahr 2018 abgeschlossen.

**8. Kreisstraße CO 6, Ausbau in der OD Heilgersdorf von Kirche bis zur  
Brücke über den Bischwinder Graben  
HSt 1.6506.9501**

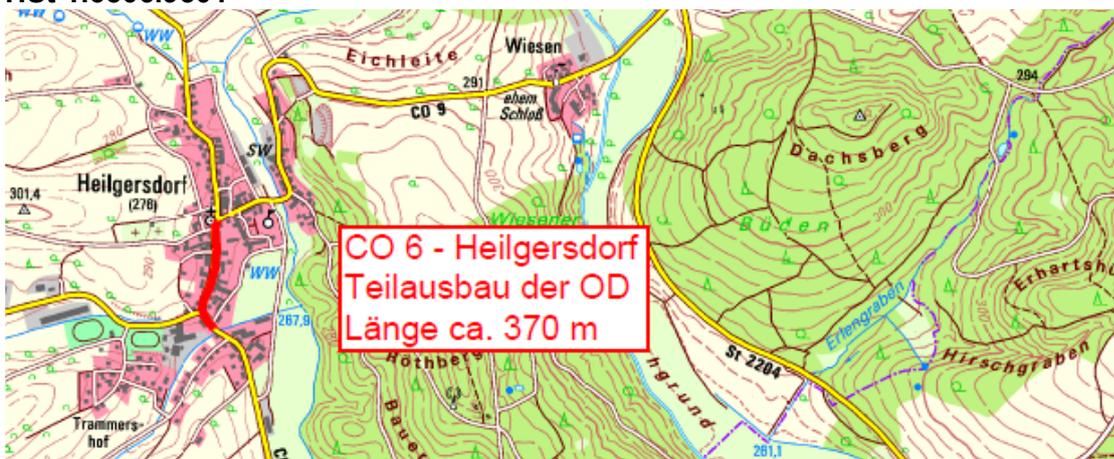

VZ 2015: 703 Kfz/24h, 37 SV (=5,3%)

Die fachliche Stellungnahme des Staatlichen Bauamtes Bamberg liegt vor, die Einarbeitung der technischen Auflagen in die Planung ist abgeschlossen. Derzeit werden die Zuwendungsunterlagen zusammengestellt, in Kürze der Regierung vorgelegt und die Ausschreibung vorbereitet.

**9. Kreisstraße CO 6, Ausbau in der OD Heilgersdorf von Kirche in Richtung Rothenberg  
HSt 1.6506.9502**



VZ 2015: 489 Kfz/24h, 23 SV (=4,7%)

Der Planungsauftrag wurde an die Koenig + Kühnel Ingenieurbüro GmbH vergeben. Die Baumaßnahme soll im Jahr 2020 erfolgen.


**10. Kreisstraße CO 9, Erneuerung der Brücke bei Schloss Wiesen  
HHSt 1.6509.9502**



VZ 2015: 684 Kfz/24h, 42 SV (=6,1%)

Die Bauarbeiten sind abgeschlossen, die Abnahme fand am 11.07.2018. Die Firma Pfister stellt derzeit die Schlussrechnung auf.


**11. Kreisstraße CO 9, Ersatzneubau der Alsterbrücke mit Flutdurchlass in Heilgersdorf  
HHSt 1.6509.9503**

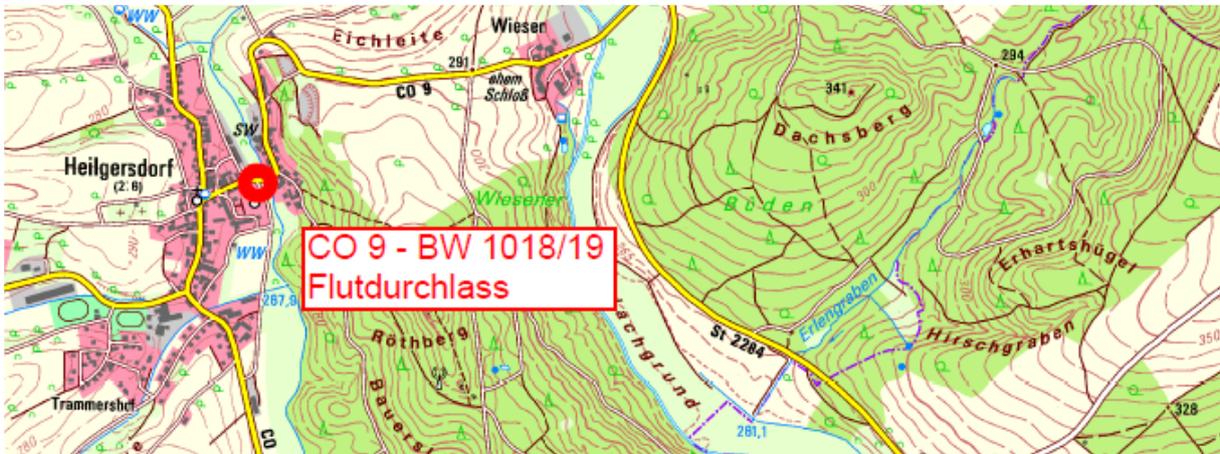

VZ 2015: 684 Kfz/24h, 42 SV (=6,1%)

Hierzu wird im Rahmen der sonstigen amtlichen Mitteilung in nichtöffentlicher Sitzung berichtet.

**12. Kreisstraße CO 12, Neuanlage Geh- und Radweg Schafhof - Wohlbach  
HHSt 1.6512.9503**

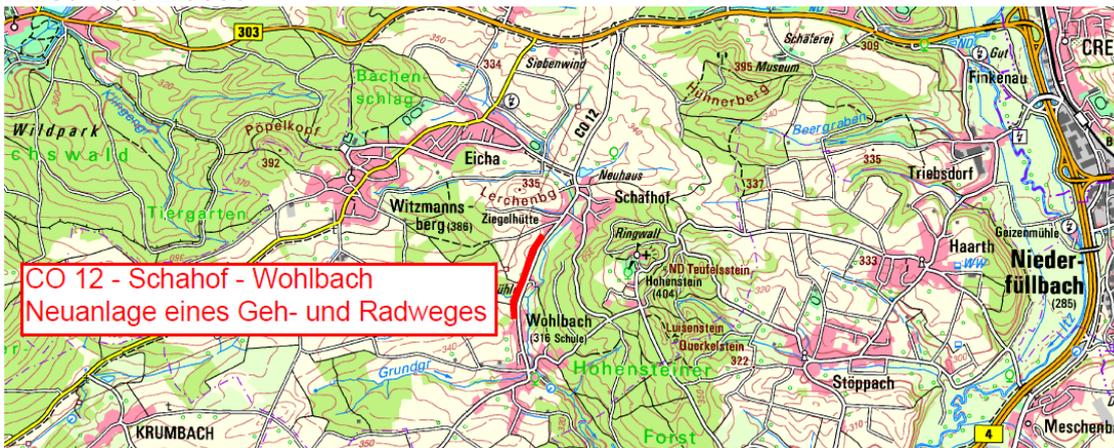

VZ 2015: 2.137 Kfz/24h, SV 88 (=4,1 %)

Die Entwurfsplanung ist derzeit hinsichtlich Grunderwerb in Abstimmung mit der Gemeinde Ahorn, parallel dazu erfolgt die Kostenberechnung. Die Baumaßnahme soll im Jahr 2019 durchgeführt werden.

**13. Kreisstraße CO 13, Umgehung Ebersdorf und Kreuzungsumbau B 303  
HHSt 1.6513.9501 und 9502**



VZ 2015: 5.363 Kfz/24h, 607 SV (=11,3%) – CO 13 neu: 7.800 Kfz/24h  
Über die Geh- und Radwegunterführung (BW 03) sowie die Bepflanzung der Umgehungstrasse wird im Rahmen der sonstigen amtlichen Mitteilung in öffentlicher Sitzung berichtet.


Die Bauarbeiten zur Ertüchtigung der Anschlussstelle Ebersdorf wird im Rahmen des TOP 9 in öffentlicher Sitzung berichtet.

**14. Kreisstraße CO 14, Ausbau zwischen Fischbach und Höhn  
HHSt 1.6514.9501**



VZ 2015: 435 Kfz/24h, SV 17 (=3,9 %)  
Die Planung wird durch den Fachbereich erfolgen. Derzeit laufen die vorbereitenden Untersuchungen (Baugrundaufschlüsse, Vorerhebungen, usw.). Die Baumaßnahme ist zeitlich in 2020 nicht mehr umsetzbar und sollte auf 2021 geschoben werden.

**15 Kreisstraße CO 14, Beteiligung an EÜ und KVP in Neustadt  
HHSt 1.6514.9820 und 9821**

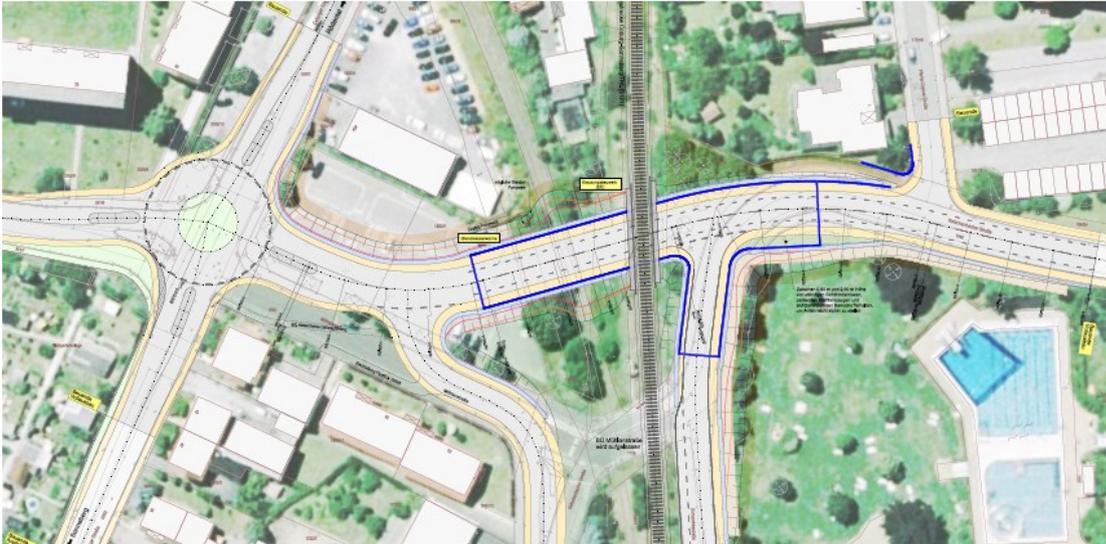


VZ 2015: 2.462 Kfz/24h, 63 SV (=2,6%)

Die Baumaßnahmen und die zugehörigen Planungen werden durch die Stadt Neustadt bei Coburg wahrgenommen. Der Landkreis beteiligt sich auf Grund der abgeschlossenen Vereinbarung mit der Stadt an den Planungskosten.

Die Kreuzungsbeteiligten favorisieren ein Planfeststellungsverfahren nach Straßenrecht, da zeitliche Vorteile gegenüber einem Verfahren nach Eisenbahnrecht zu erwarten sind. Betreiber des Planfeststellungsverfahrens wird der Landkreis als Straßenbauaussträger der querenden Straße sein.

**16. Kreisstraße CO 16, Ausbau Deponie – KVP Seßlach  
HHSt 1.6516.9501**

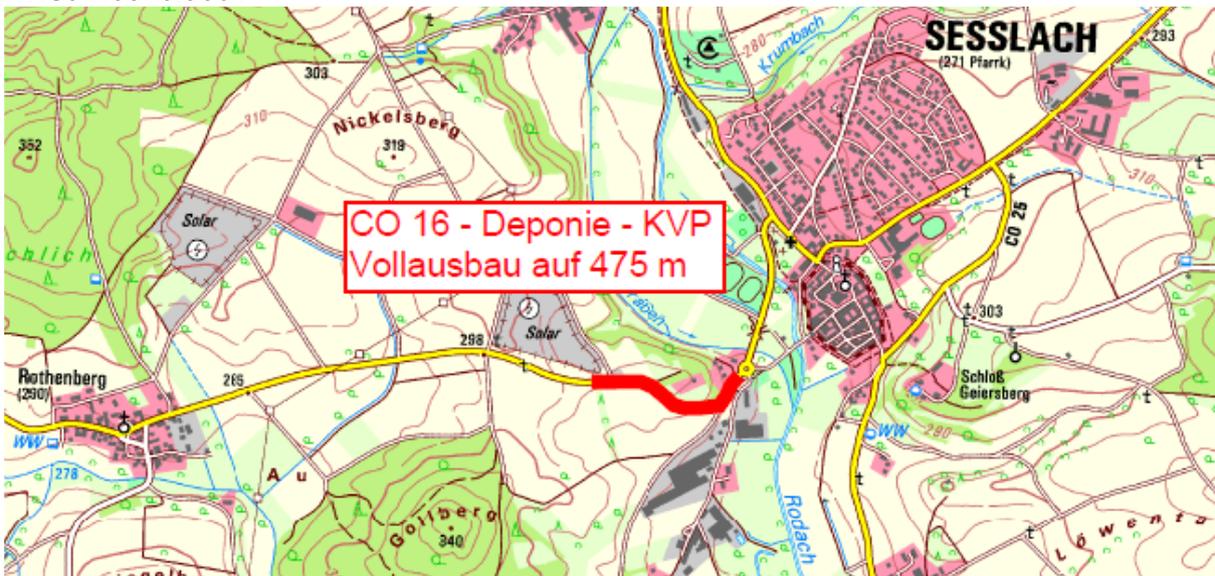

VZ 2015: 948 Kfz/24h, SV 36 (=3,8 %)

Die Baumaßnahme ist für das Jahr 2020 vorgesehen. Erste Vorgespräche mit der Regierung hinsichtlich Förderfähigkeit fanden statt. Auf eine Variantenuntersuchung wird hinsichtlich flächenschonenden, bestandsnahen Ausbau verzichtet. Zwischen dem Kreisverkehrsplatz und dem Feld- und Waldweg nach Heilgersdorf soll ein Lückenschluss im Radwegenetz durch Anlage eines gesonderten des Geh- und Radweges erfolgen.


**17. Kreisstraße CO 16, Verbesserung der Entwässerung und Bau einer Amphibienleitwand bei Krumbach**  
HHSt 1.6516.9502



VZ 2015: 3.498 Kfz/24h, SV 234 (=6,7 %)


Die Baumaßnahme wird durch die Straßenmeisterei ausgeführt und ist fast abgeschlossen.

**18. Kreisstraße CO 16, Umbau Knoten am Hattersdorfer Tor in Seßlach**  
HHSt 1.6516.9810

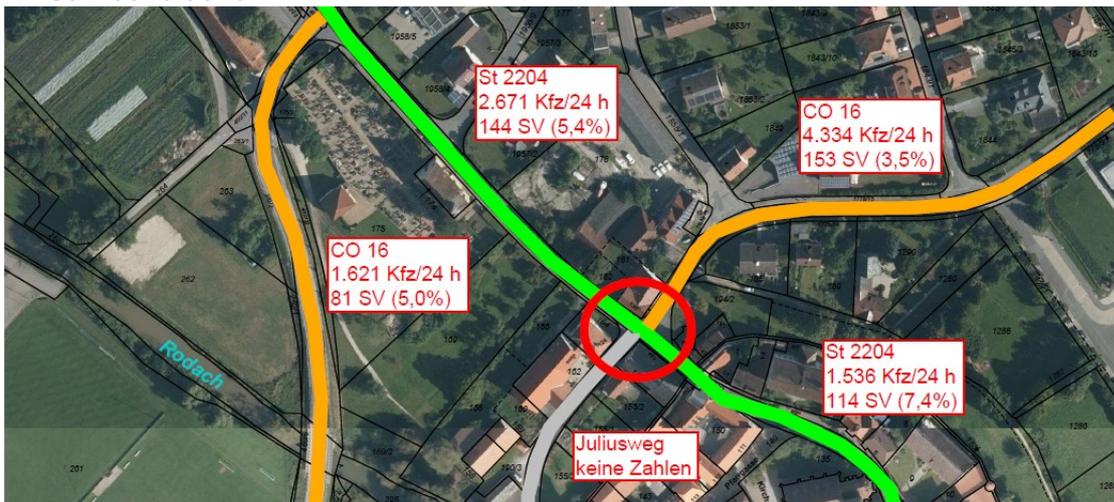

Der Erwerb des Haus durch den Freistaat ist zwischenzeitlich erfolgt und wird durch diesen vorfinanziert. Die Planung des Mikrokreisverkehrsplatzes wird vom Staatlichen Straßenbauamt Bamberg durchgeführt, der Landkreis ist gemäß Kreuzungsrecht Kostenträger mit ca. 1/3 Anteil. Genaueres wird in einer noch zu erstellenden Kreuzungsvereinbarung geregelt.


19. Kreisstraße CO 17, Neubau der Brücke über die Walbur bei Kleinwalbur  
HHSt 1.6517.9502

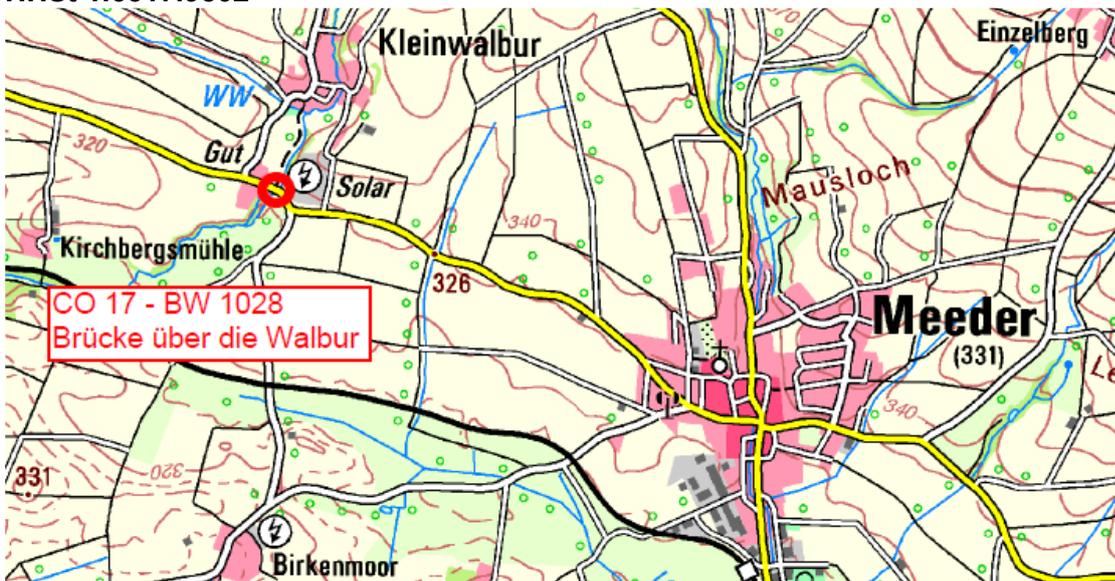

VZ 2015: 1.204 Kfz/24h, 35 SV (=2,9%)

Die Baumaßnahme ist abgeschlossen. Die Firma Richard Schulz Tiefbau GmbH stellt derzeit die Schlussrechnung auf.


20. Kreisstraße CO 17, Ausbau in der OD Unterwohlsbach  
HHSt 1.6517 9503

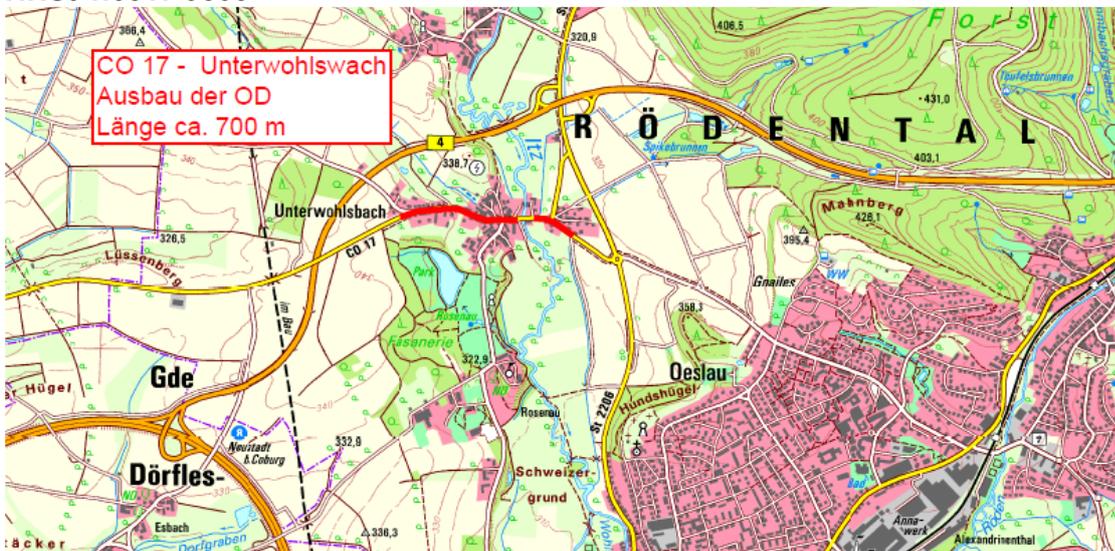

VZ 2015: 5.599 Kfz/24h, 244 SV (=4,4%)

Die Baumaßnahme ist abgeschlossen. Die Firma Firma STRABAG AG stellt derzeit die Schlussrechnung auf.

**21. Kreisstraße CO 17, Ausbau zwischen Kleinwalbur und Meeder  
HHSt 1.6517.9507**

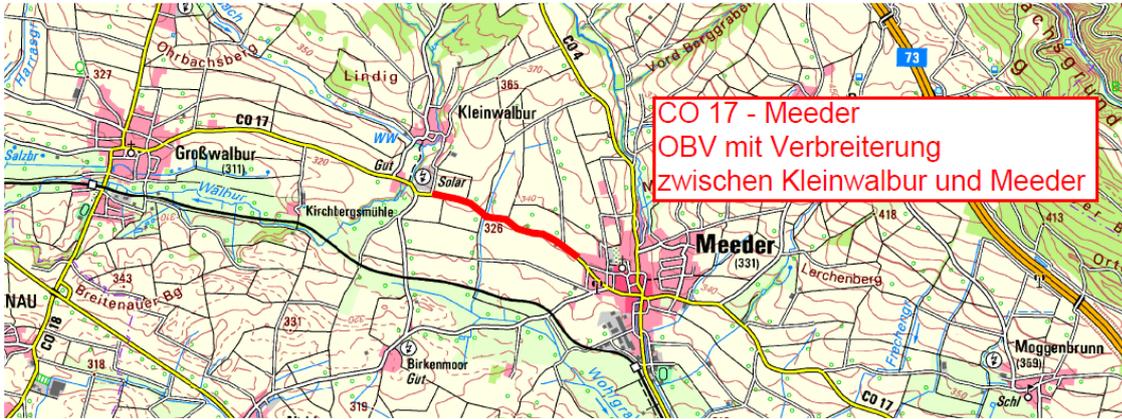

VZ 2015: 1.204 Kfz/24h, 35 SV (=2,9%)

Über die Maßnahme wird im Rahmen des TOP 10 in öffentlicher Sitzung berichtet.


**22. Kreisstraße CO 19, Rodachbrücke bei Gemünda  
HHSt 1.6519.9501**



VZ 2015: 335 Kfz/24h, 11 SV (=3,3%)

Hierzu wird im Rahmen der sonstigen amtlichen Mitteilung in nichtöffentlicher Sitzung berichtet.

**23. Kreisstraße CO 19, Kreckbrücke in Gemünda  
HHSt 1.6519.9503**

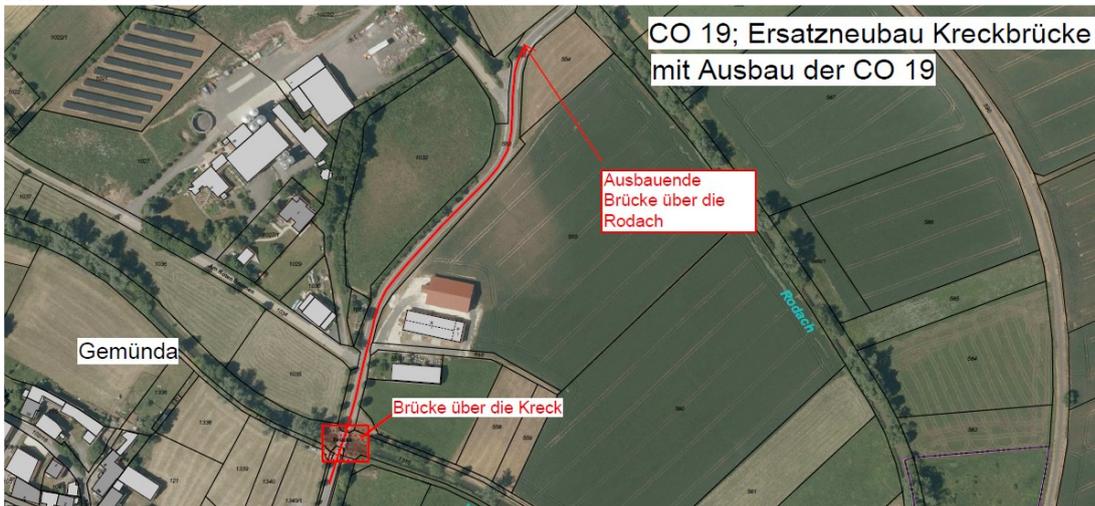

VZ 2015: 335 Kfz/24h, 11 SV (=3,3%)

Hierzu wird im Rahmen der sonstigen amtlichen Mitteilung in nichtöffentlicher Sitzung berichtet.

**24. Kreisstraße CO 20, Ausbau der OD Autenhausen  
HHSt 1.6520.9501**



VZ 2015: 560 Kfz/24h, 59 SV (=10,5%)

Die Arbeiten sind abgeschlossen, derzeit stellt die Firma STRABAG AG die Schlussrechnung auf.


**25. Kreisstraße CO 25, Generalsanierung Watzendorf - Seßlach  
HHSt 1.6525.9502**



VZ 2015: 645 Kfz/24h, 31 SV (=4,8%)

Die Planung wird durch den Fachbereich Tiefbau erstellt und soll nach Rücksprache mit der Stadt Seßlach im 2019 realisiert werden.

**26. Kreisstraße CO 27, Lauterbachbrücke in Oberlauter - Kappensanierung  
HHSt 1.6527.9505**

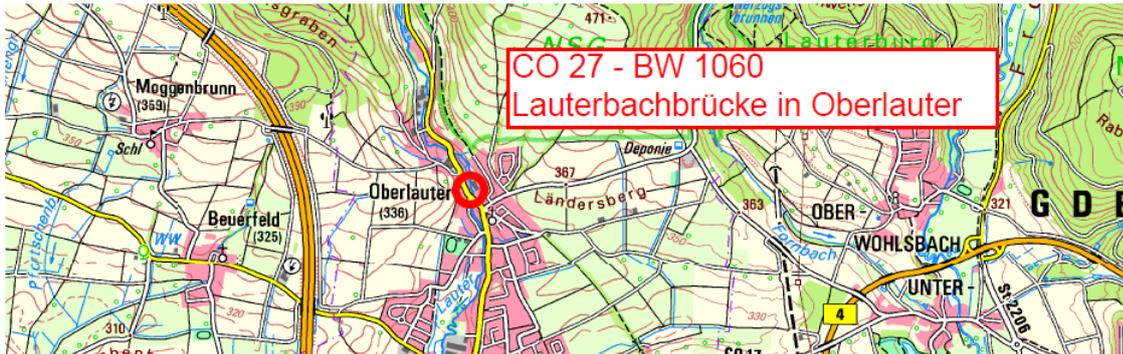

VZ 2015: 2.964 Kfz/24h, 154 SV (=5,2%)

Hierzu wird im Rahmen der sonstigen amtlichen Mitteilung in öffentlicher Sitzung berichtet.


**27. Kreisstraße CO 28, Kreisverkehrsplatz Untersiemau  
HHSt 1.6528.9502**



VZ 2015: 6.948 Kfz/24h, 226 SV (=3,3%)

Die fachlichen Stellungnahme des Staatlichen Bauamtes Bamberg liegt vor, derzeit erfolgt die Einarbeitung der technischen Auflagen in die Planung. Anschließend sind die Zuwendungsunterlagen zusammen zu stellen und der Regierung vorzulegen. Parallel dazu wird die Ausschreibung bereits vorbereitet.

**28. Kreisstraße CO 28, Sanierung von Stützmauern in Untersiemau  
Keine HHSt**

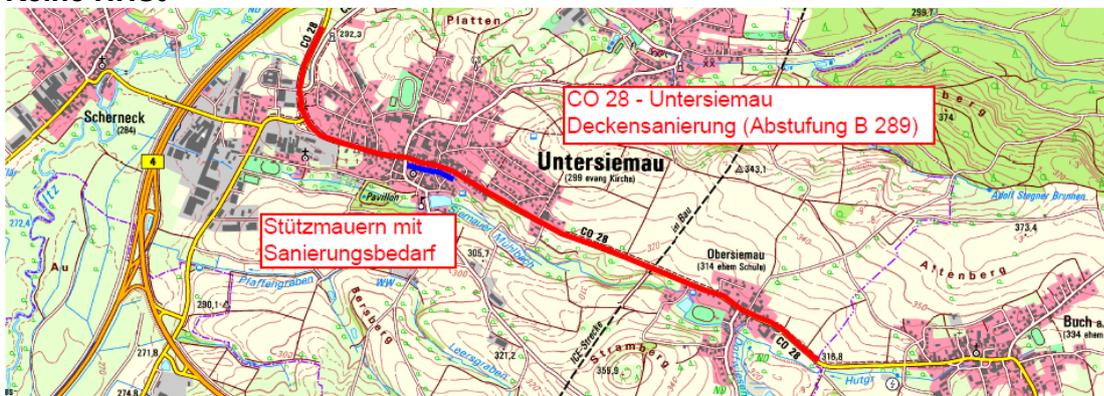

VZ 2010: 9.108 Kfz/24h, 748 SV (=8,2%)

Hierzu wird im Rahmen der sonstigen amtlichen Mitteilung in öffentlicher Sitzung berichtet.

- II. In Finanzangelegenheiten  
an FB Z3  
mit der Bitte um Mitzeichnung. ....
  
- III. An FBL 43  
mit der Bitte um Mitzeichnung. ....
  
- IV. An GBL 4  
mit der Bitte um Mitzeichnung. ....
  
- V. An Büro Landrat  
mit der Bitte um Mitzeichnung.  
- immer erforderlich - .....
  
- VI. WV am Sitzungstag beim zuständigen Sitzungsdienst.
  
- VII. Zum Akt/Vorgang

Name  
(*Unterschrift Vorlagenersteller*)

Landratsamt Coburg

Rainer Mattern  
Stellvertreter des Landrats
