

Informationsvorlage

Fachbereich:	FB Z3 Finanzen	Datum:	08.05.2018
Berichtersteller:	Alt, Jürgen	AZ:	FB 43
		Vorlage Nr.:	059/2018

Beratungsfolge	Termin	Behandlung
Bauausschuss	17.05.2018	öffentlich -

Tiefbaumaßnahmen des Landkreises; Sachstandsbericht zu den derzeit laufenden Baumaßnahmen

I. Sachverhalt

Achtung:

Die Zahlen für den Schwerverkehr sind auf Grund geänderter Zuordnungsparameter bei der VZ 2015 nicht direkt mit den Vorjahren vergleichbar!

1. Kreisstraßen, Deckenbau allgemein – HHSt 1.6500.9501

Alte Maßnahmen aus dem Jahr 2017

Kreisstraße CO 4 – DSH-V zwischen Meeder und der GVS nach Mirsdorf

Kreisstraße CO 27 – DSH-V zwischen Rottenbach und Tremersdorf




,6%)
VZ 2015: 920 Kfz/24h, 31 SV (=3,4%)



VZ 2010: 558 Kfz/24h, 64 SV (=11,5%)
VZ 2015: 550 Kfz/24h, 39 SV (=7,1%)

Beide Maßnahmen sind abgeschlossen. Die Schlussrechnung durch die Thiendorfer Fräsdienst GmbH & Co. KG, Thiendorf liegt um 4,6% über der Auftragssumme. An der CO 27 erfolgt die Mängelbeseitigung der Wellen im Belag bis zum 28.06.2018. Bei der CO 4 wurde wegen Problemen mit der Haftzugfestigkeit die Gewährleistung auf vier Jahre verlängert.

Neue Maßnahmen im Jahr 2018
Kreisstraße CO 4 – Deckenbau in der OD Grattstadt
Kreisstraße CO 12 – Deckenbau in der OD Großheirath

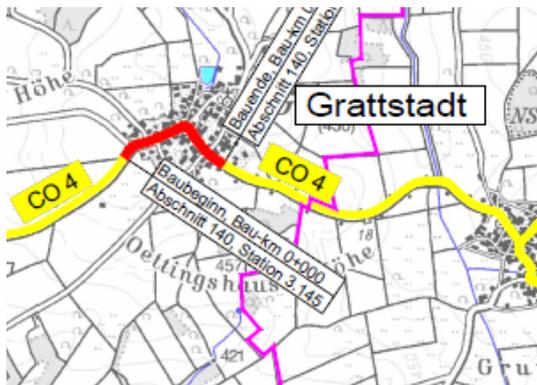


VZ 2010: 611 Kfz/24h, 26 SV (=4,3%)
VZ 2015: 930 Kfz/24h, 34 SV (=3,7%)



VZ 2010: 1.027 Kfz/24h, 78 SV (=7,6%)
VZ 2015: 1.038 Kfz/24h, 41 SV (=3,9%)

Kreisstraße CO 16 – Deckenbau zwischen Lechenroth und Oberelldorf

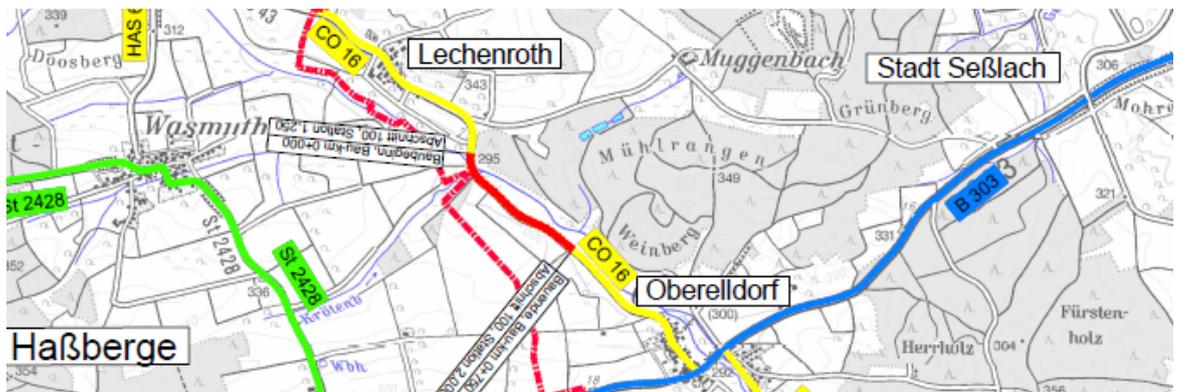

VZ 2010: 346 Kfz/24h, 44 SV (=12,7%)
VZ 2015: 168 Kfz/24h, 7 SV (=4,2%)

Die Maßnahmen werden in eigenen Tagesordnungspunkten in der nichtöffentlichen Sitzung behandelt.

2. Kreisstraße CO 4;
Ausbau der OD Bad Rodach, Richtung Heldritt
HHSt 1.6504.9502



VZ 2010: 2.409 Kfz/24h, 66 SV (=2,7%)
VZ 2015: 2.397 Kfz/24h, 39 SV (=1,6%)

Die Maßnahme wird in einem eigenen Tagesordnungspunkt behandelt.


**3. Kreisstraße CO 4;
Ausbau der OD Weidach
HHSt 1.6504.9506**



VZ 2010: 1.585 Kfz/24h, 76 SV (=4,8%)
VZ 2015: 1.419 Kfz/24h, 98 SV (=6,9%)

Die Baumaßnahme ist abgeschlossen, es fehlen nur noch Einfriedungen an Privatgrundstücken. Derzeit wird die Schlussrechnung durch die Firma STRABAG AG, Neudrossenfeld erstellt.

**4. Kreisstraße CO 4;
Ausbau von Weidach bis zur Stadtgrenze
HHSt 1.6504.9507**

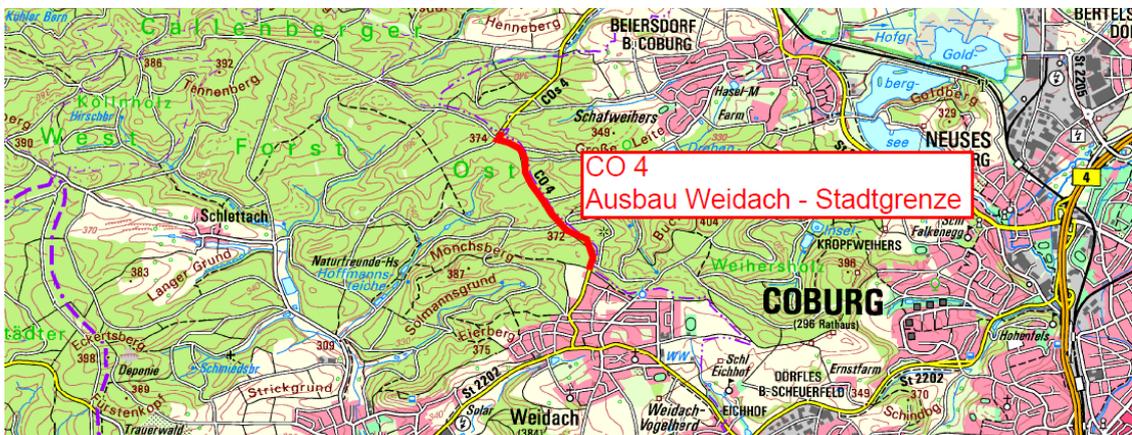

VZ 2010: 1.585 Kfz/24h, 76 SV (=4,8%)
VZ 2015: 1.419 Kfz/24h, 98 SV (=6,9%)

Die Planung wird an die Koenig + Kühnel Ingenieurbüro GmbH, Weidach vergeben. Die Baumaßnahme soll im Jahr 2019 erfolgen.

**5. Kreisstraße CO 4;
Erneuerung Grundgrabenbrücke bei Ottowind
HHSt 1.6504.9508**



VZ 2010: 1.015 Kfz/24h, 57 SV (=5,6%)
VZ 2015: 920 Kfz/24h, 31 SV (=3,4%)

Die Maßnahme wird in einem eigenen Tagesordnungspunkt behandelt.

**6. Kreisstraße CO 6;
Ausbau in der OD Heilgersdorf von Kirche bis zur Brücke über den Bischwinder Graben
HHSt 1.6509.9501**



VZ 2010: 848 Kfz/24h, 52 SV (=6,1%)
VZ 2015: 703 Kfz/24h, 37 SV (=5,3%)

Die Maßnahme wird in einem eigenen Tagesordnungspunkt behandelt.

**7. Kreisstraße CO 6;
Ausbau in der OD Heilgersdorf von Kirche in Richtung Rothenberg
HHSt 1.6509.9502**



VZ 2010: 617 Kfz/24h, 55 SV (=8,9%)
VZ 2015: 489 Kfz/24h, 23 SV (=4,7%)

Die Planung wird an die Koenig + Kühnel Ingenieurbüro GmbH, Weidach vergeben.
Die Baumaßnahme soll im Jahr 2020 erfolgen.


**8. Kreisstraße CO 9;
Erneuerung der Brücke bei Schloss Wiesen
HHSt 1.6509.9502**



VZ 2010: 762 Kfz/24h, 46 SV (=6,0%)
VZ 2015: 684 Kfz/24h, 42 SV (=6,1%)

Die Bauarbeiten laufen plangemäß, ab 17.05. erfolgt die Vollsperrung der Staatsstraße zum Umbau der Einmündung.

**9. Kreisstraße CO 12;
Neuanlage Geh- und Radweg Schafhof – Wohlbach
HHSt 1.6512.9503**

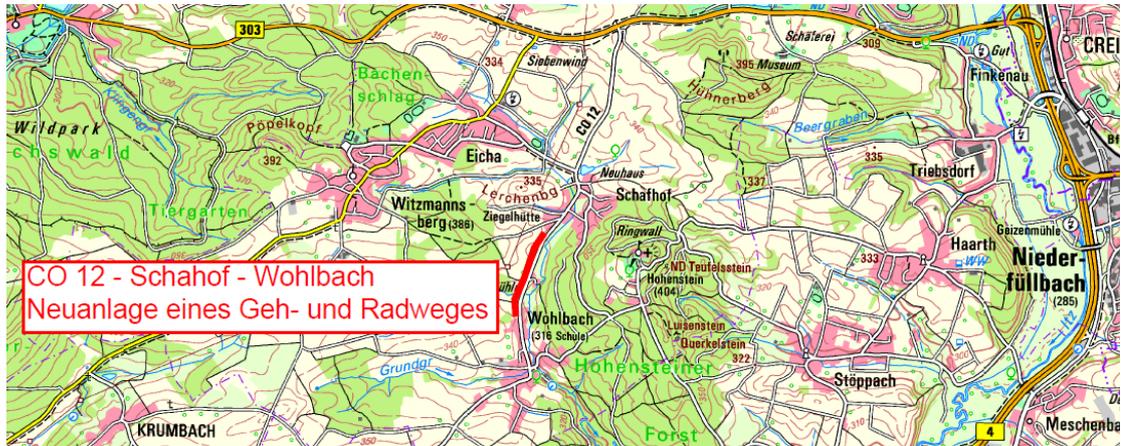

VZ 2010: 2.002 Kfz/24h, SV 86 (=4,3 %)
VZ 2015: 2.137 Kfz/24h, SV 88 (=4,1 %)

Die Baumaßnahme wird derzeit im Fachbereich im Zuge des Praktikums einer Studentin der FH Coburg geplant. Die Vermessung ist durchgeführt und die ergänzende Baugrunduntersuchung wird am 17.05.2018 erfolgen. Die Baumaßnahme soll im Jahr 2019 durchgeführt werden.

**10. Kreisstraße CO 13;
Umgehung Ebersdorf b. Coburg
HHSt 1.6513.9501**



VZ 2010: 5.714 Kfz/24h, 701 SV (=12,3%)
VZ 2015: 5.363 Kfz/24h, 607 SV (=11,3%) – CO 13 neu: 7.800 Kfz/24h

Die Hauptbaumaßnahme ist abgeschlossen. Es fehlt noch die Begrünung und die Geh- und Radwegunterführung (BW 03) an der alten CO 13 in Ebersdorf. Die Kosten der Baumaßnahme werden sich gegenüber der Auftragssumme erhöhen, bleiben aber im Rahmen der Kostenberechnung.

Die europaweite Ausschreibung von BW 03 mit Baubeginn im März 2019 wird Anfang Juli im Staatsanzeiger veröffentlicht.

Die Bauarbeiten zur Ertüchtigung der Anschlussstelle Ebersdorf sind noch am Laufen. Mit einem Abschluss ist Anfang/Mitte Juli 2018 zu rechnen. Anschließend soll das Bürgerfest für die CO 13 nachgeholt werden.

**11. Kreisstraße CO 14;
Ausbau zwischen Fischbach und Höhn
HHSt 1.6514.9501**




VZ 2010: 742 Kfz/24h, SV 51 (=6,9 %)

VZ 2015: 435 Kfz/24h, SV 17 (=3,9 %)

Die Planung soll durch den Fachbereich erfolgen. Die Baugrundaufschlüsse werden demnächst beauftragt. Ein Baubeginn in 2020 ist nicht realisierbar und die Baumaßnahme soll nun vollständig im Jahr 2021 abgewickelt werden.


**12 Kreisstraße CO 14;
Beteiligung an EÜ und KVP in Neustadt
HHSt 1.6514.9920/9821**

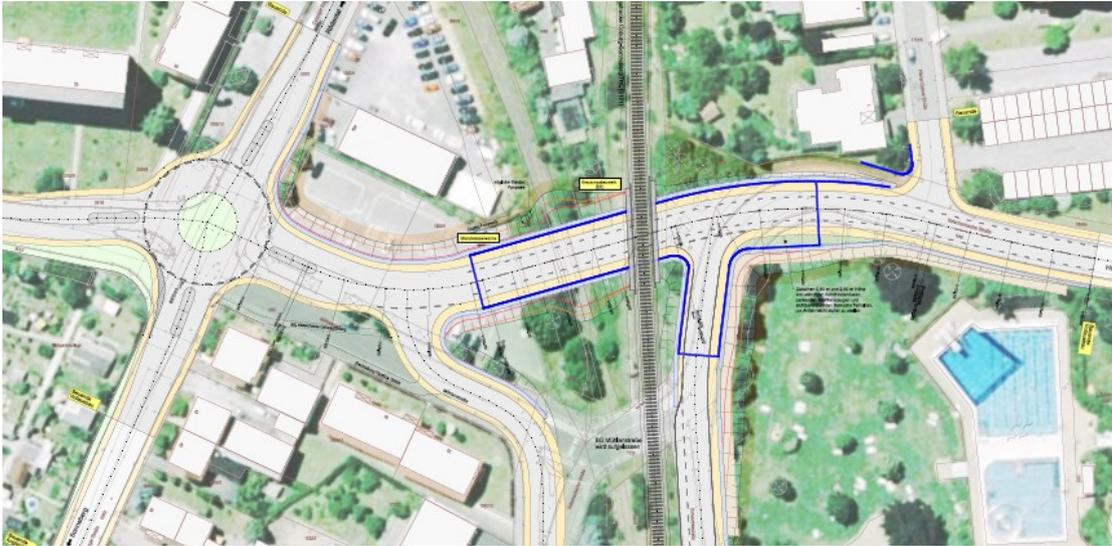

VZ 2010: 2.633 Kfz/24h, 67 SV (=2,5%)
VZ 2015: 2.462 Kfz/24h, 63 SV (=2,6%)

Die Baumaßnahmen und die zugehörigen Planungen werden durch die Stadt Neustadt bei Coburg wahrgenommen. Der Landkreis beteiligt sich auf Grund der abgeschlossenen Vereinbarung mit der Stadt an den Planungskosten. Die Abstimmung mit der Bahn ist weiterhin nicht abgeschlossen.


**13. Kreisstraße CO 16;
Ausbau Deponie – KVP Seßlach
HHSt 1.6516.9501**

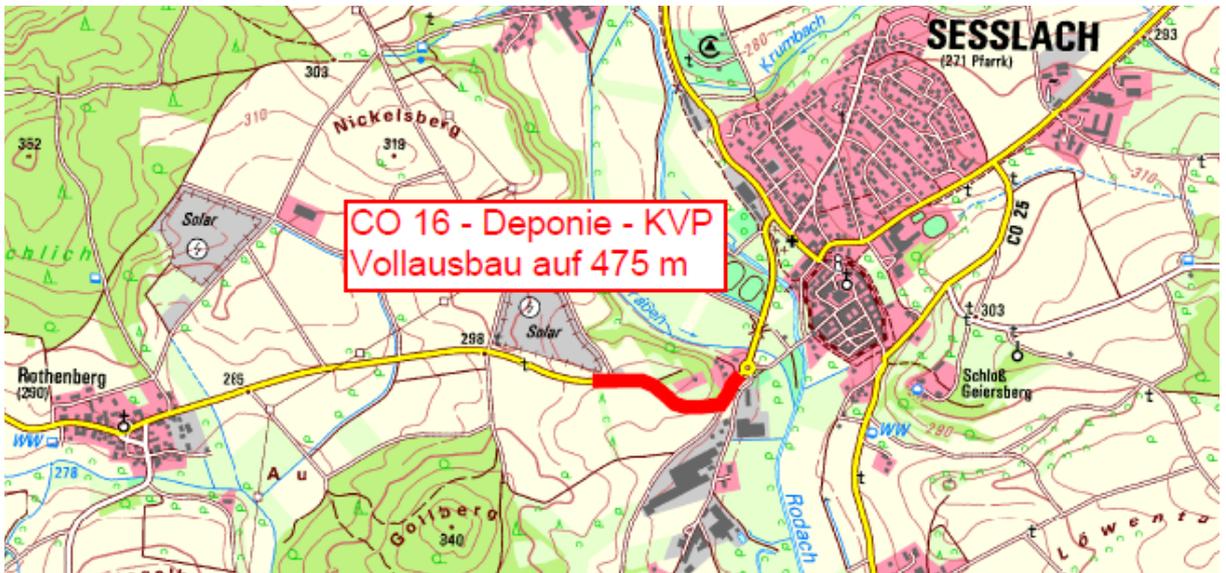

VZ 2010: 1.621 Kfz/24h, SV 81 (=5,0 %)
VZ 2015: 948 Kfz/24h, SV 36 (=3,8 %)

Die Baumaßnahme ist für das Jahr 2020 vorgesehen. Aufgrund der letzten Erfahrungen bei Baumaßnahmen wird davon ausgegangen, dass für den Grunderwerb erheblich mehr Zeit einzuplanen ist, als bisher angenommen. Zudem sind im Vorfeld Variantenuntersuchungen erforderlich. Die Planung wird demnächst beauftragt.


**14. Kreisstraße CO 17;
Neubau der Brücke über die Walbur bei Kleinwalbur
HHSt 1.6517.9502**

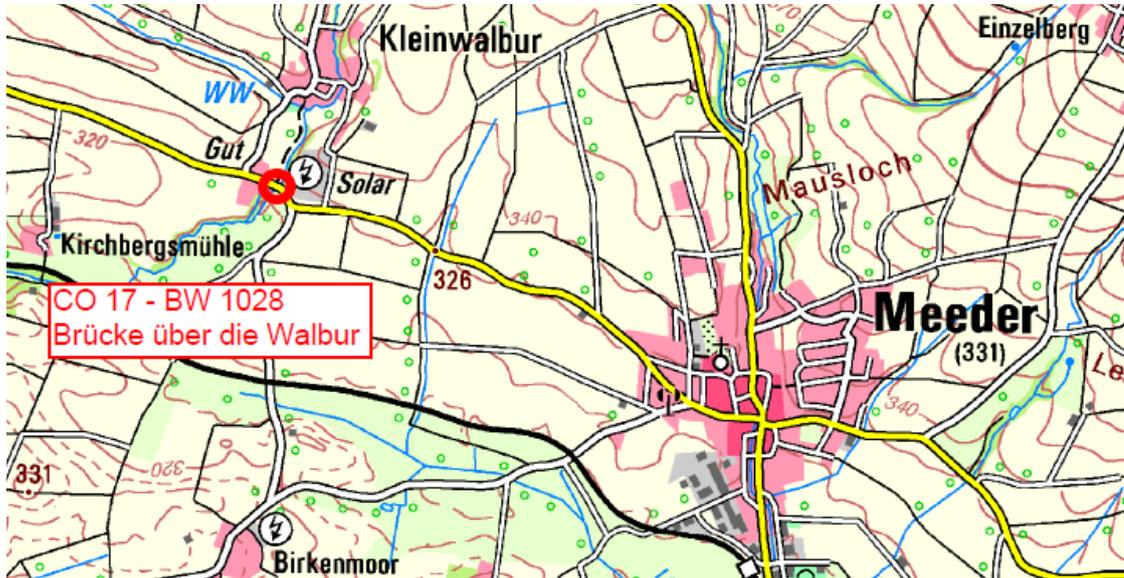

VZ 2010: 1.158 Kfz/24h, 62 SV (=5,4%)
VZ 2015: 1.204 Kfz/24h, 35 SV (=2,9%)

Die Baumaßnahme ist abgeschlossen. Derzeit wird die Schlussrechnung von der Firma Richard Schulz Tiefbau GmbH, Buttenheim erstellt.


**15. Kreisstraße CO 17;
Ausbau in der OD Unterwohlsbach
HHSt 1.6517 9503**

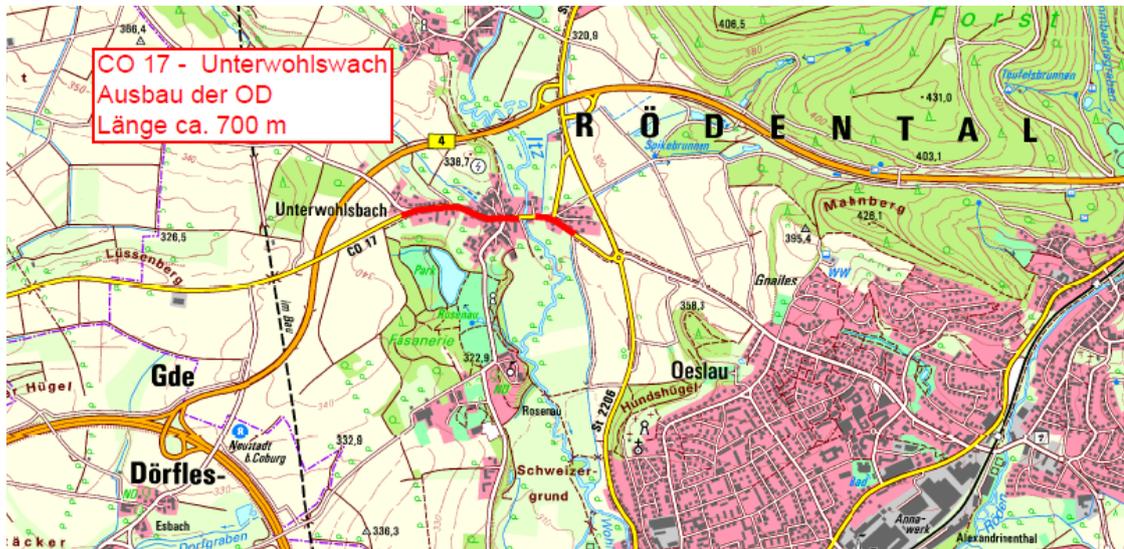

VZ 2010: 5.245 Kfz/24h, 236 SV (=4,5%)
VZ 2015: 5.599 Kfz/24h, 244 SV (=4,4%)

Die Baumaßnahme ist abgeschlossen. Derzeit wird die Schlussrechnung von der Firma STRABAG AG, Eisfeld erstellt.


**16. Kreisstraße CO 17;
Bau von Geh- und Radwegen in Unterlauter
HHSt 1.6517.9504**

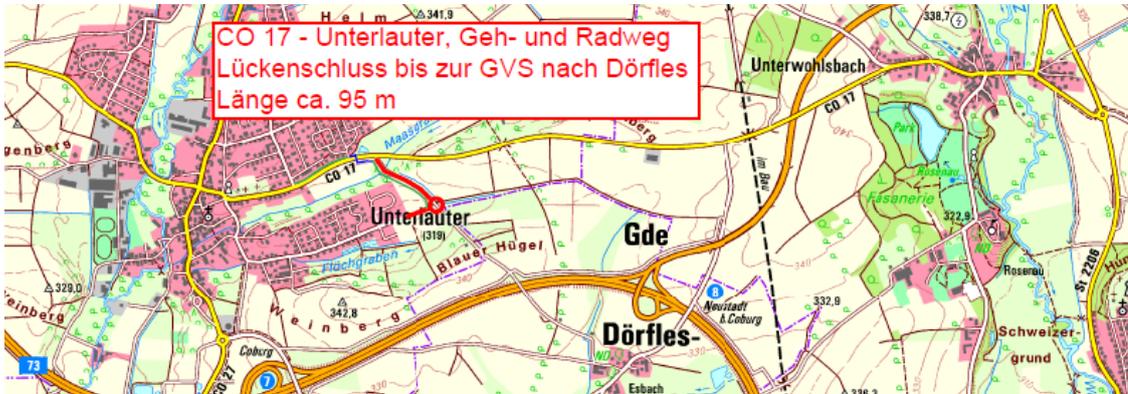

VZ 2010: 2.922 Kfz/24h, 138 SV (=4,7%)
VZ 2015: 2.245 Kfz/24h, 149 SV (=6,6%)

Die Baumaßnahme ist abgeschlossen und mit der Gemeinde schlussgerechnet. Es fehlt noch der Abschluss des Grunderwerbs, anschließend ist der Verwendungsnachweis zu erstellen.


**17. Kreisstraße CO 17;
Oberbauverstärkung Kleinwalbur - Meeder
HHSt 1.6517.9507**

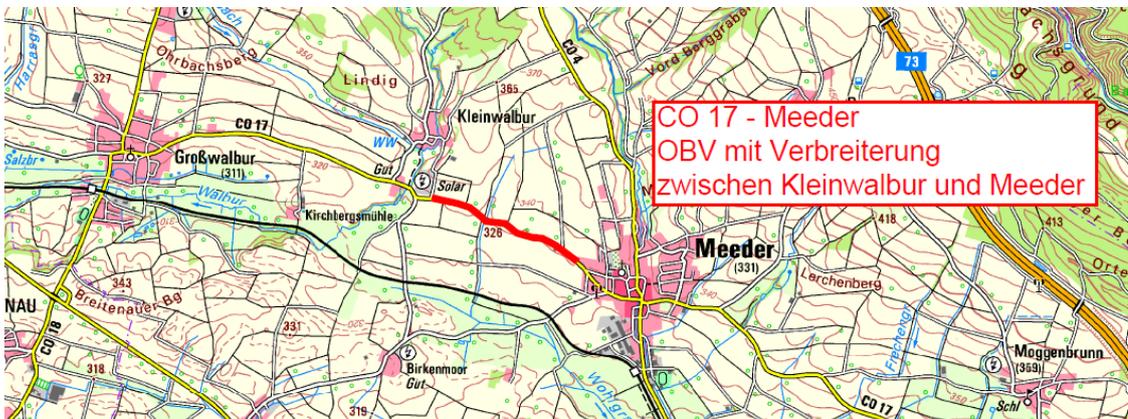

VZ 2010: 1.158 Kfz/24h, 62 SV (=5,4%)
VZ 2015: 1.204 Kfz/24h, 35 SV (=2,9%)

Die Maßnahme wird in einem eigenen Tagesordnungspunkt behandelt.

**18. Kreisstraße CO 18;
Fohlenbachbrücke bei Sülzfeld
HHSt 1.6518.9502**

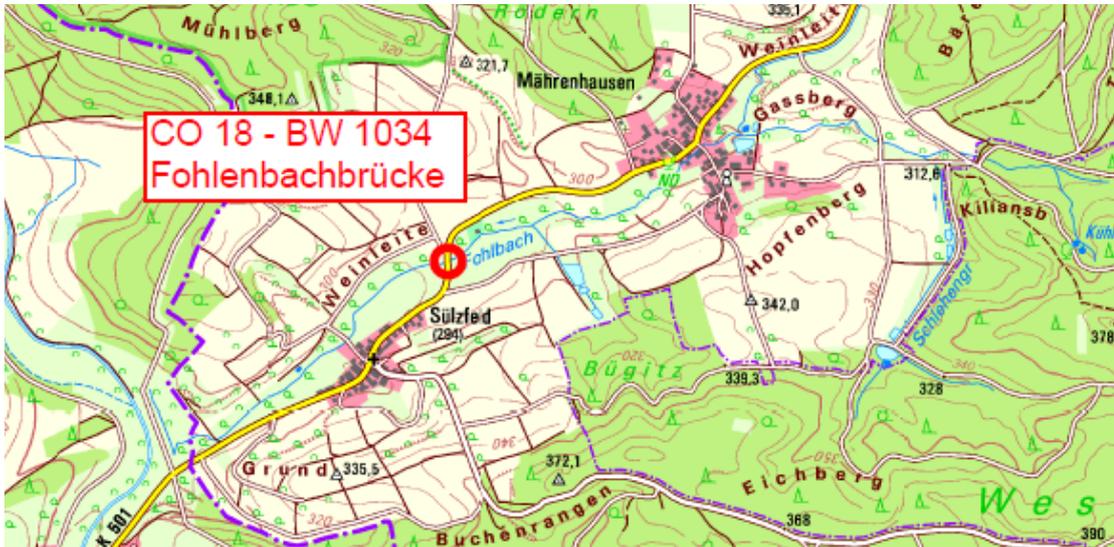

VZ 2010: 2.101 Kfz/24h, 140 SV (=6,7%)

VZ 2015: 539 Kfz/24h, 29 SV (=5,4%)

Die Baumaßnahme ist abgeschlossen. Derzeit wird die Schlussrechnung von der Firma Pfister, Seßlach erstellt.

**19. Kreisstraße CO 19;
Rodachbrücke bei Gemünda
HHSt 1.6519.9501**



VZ 2010: 367 Kfz/24h, 16 SV (=4,4%)

VZ 2015: 335 Kfz/24h, 11 SV (=3,3%)

Die Maßnahme wird in einem eigenen Tagesordnungspunkt behandelt.

**20. Kreisstraße CO 20;
Ausbau der OD Autenhausen
HHSt 1.6520.9501**



VZ 2010: 656 Kfz/24h, 37 SV (=5,6%)
VZ 2015: 560 Kfz/24h, 59 SV (=10,5%)

Die Arbeiten sind abgeschlossen, derzeit wird die Schlussrechnung durch die Firma STRABAG AG, Eisfeld erstellt.


**21. Kreisstraße CO 25;
Generalsanierung Watzendorfer Berg - Seßlach
HHSt 1.6525.9502**



VZ 2010: 621 Kfz/24h, 41 SV (=6,6%)
VZ 2015: 645 Kfz/24h, 31 SV (=4,8%)

Die Planung wird durch den Fachbereich Tiefbau erstellt und muss bereits mehrmals geschoben werden. Nunmehr ist vorgesehen, die Baumaßnahme im Jahr 2019 zu realisieren.


**22. Kreisstraße CO 27;
Lauterbachbrücke in Oberlauter - Kappensanierung
HHSt 1.6527.9505**

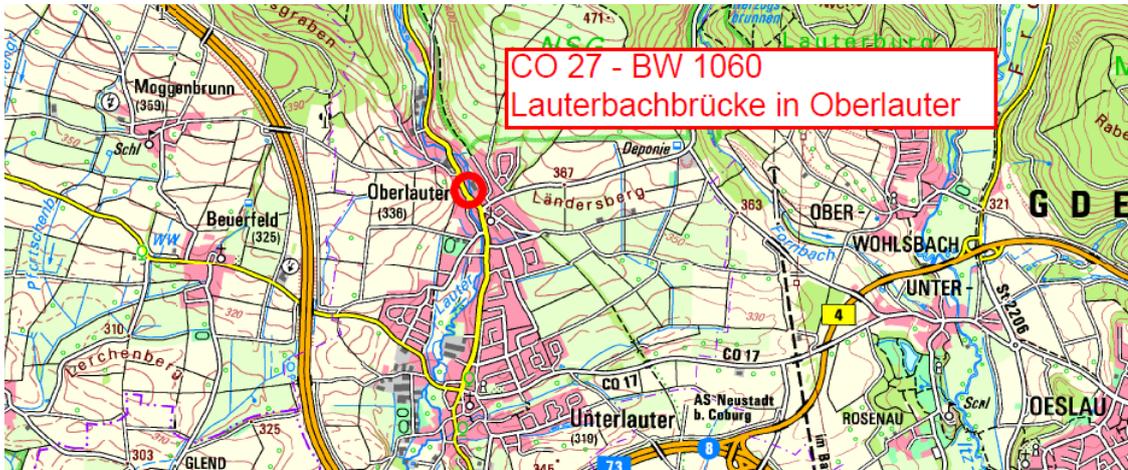

VZ 2010: 2.912 Kfz/24h, 162 SV (=5,6%)
VZ 2015: 2.964 Kfz/24h, 154 SV (=5,2%)

Die Maßnahme wird in einem eigenen Tagesordnungspunkt behandelt.

**23. Kreisstraße CO 28;
Abstufung B 289
HHSt 1.6528.9501**

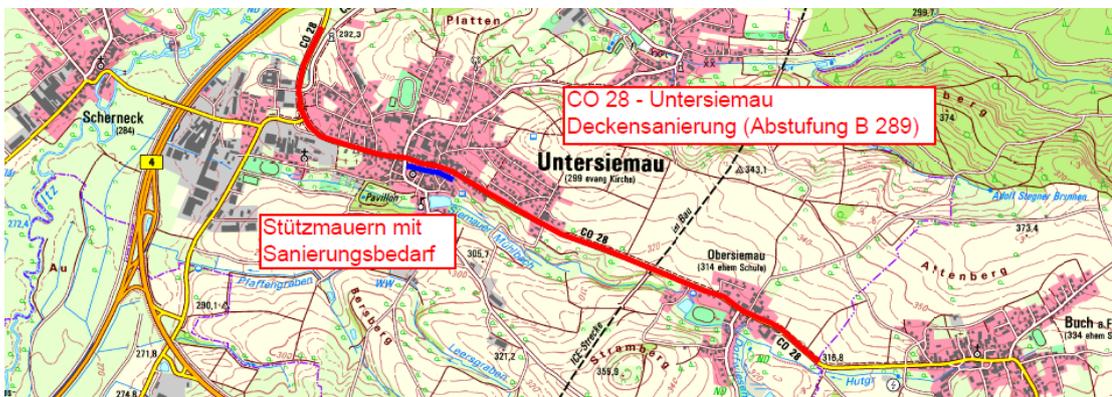

VZ 2010: 9.108 Kfz/24h, 748 SV (=8,2%)
VZ 2015: 6.948 Kfz/24h, 226 SV (=3,3%)

Die Maßnahmen werden in eigenen Tagesordnungspunkten behandelt.

- II. an FB 43 – Jürgen Alt
mit der Bitte um Mitzeichnung.

- III. An GBZ – Dieter Pillmann
mit der Bitte um Mitzeichnung.

- IV. An Büro Landrat
mit der Bitte um Mitzeichnung.
- immer erforderlich -

- V. WV am Sitzungstag beim zuständigen Sitzungsdienst.

- VI. Zum Akt/Vorgang

(Unterschrift Vorlagenersteller)

Landratsamt Coburg

Michael Busch
Landrat
